



**Uptc**<sup>®</sup>  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia  
VIGILADA MINEUCACIÓN

# Informe 1. Primer Trimestre Dirección de Planeación

**Así  
va la U**

[www.uptc.edu.co](http://www.uptc.edu.co)

## Centro Regional Universitario -CRU- Facultad Seccional Duitama

**LA UNIVERSIDAD  
QUE QUEREMOS**

**Rendición  
de Cuentas**

**2020**



AREA CONSTRUIDA: 8,000 M2

## OBJETIVO

Construcción y funcionamiento de la nueva Seccional Duitama (CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO – CRU)


## IMPORTANCIA

Proyecto en el objeto misional de la Universidad, con el cual se pretende lograr entre otros el Fortalecimiento de la infraestructura física para el multicampus inteligente, optimizando, reforzando y ampliando las instalaciones para el servicio a la comunidad de la provincia de Tundama.



# PROGRAMA DE NECESIDADES

www.uptc.edu.co

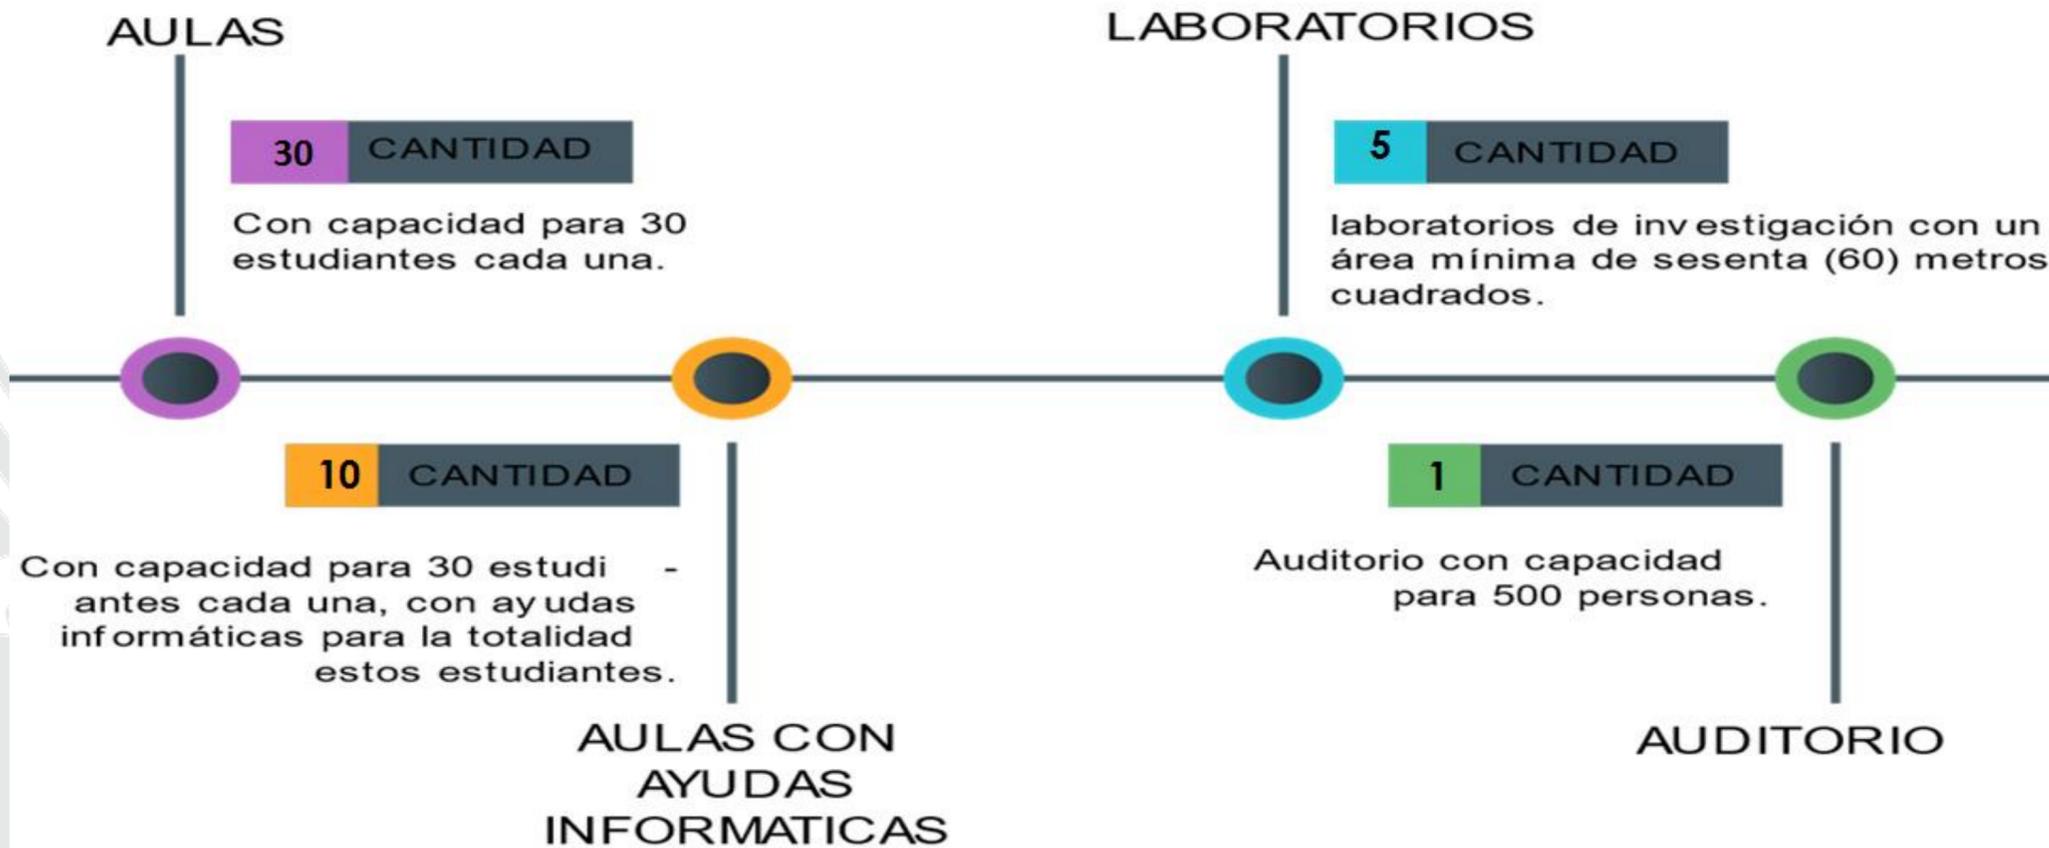

# PROGRAMA DE NECESIDADES

www.uptc.edu.co



## SALAS DE INVESTIGACIÓN

**16** CANTIDAD

oficinas para los grupos de investigación con un área mínima de 30 metros cuadrados

## BAÑOS

**CANTIDAD**

Tres (3) baterías de baño.

**1** CANTIDAD

Un (1) espacio para la coordinación administrativa de la sede en la cual se ubicara el coordinador y una asistente.

AREASOCIAL ,  
 CAFETERIAS

# EJECUCIÓN DIRECTA

- En el mes de noviembre se estudian alternativas para la ejecución de las obras correspondientes al CRU. El análisis de decisión plantea a la Universidad como ejecutor bajo la modalidad de administración directa con las siguientes consideraciones:

Ejecución directa de las obras través de un equipo de trabajo técnico y administrativo seleccionado directamente por la universidad.

Se busca generar ahorro en los recursos presupuestados. Se disminuye el costo de utilidad e imprevistos sobre el valor final del Proyecto.

La universidad asume funciones: dirigir, velar por la calidad, y gestionar la adquisición de bienes, bajo criterios de eficiencia, planeación y calidad.

Se obtiene como resultado la subcontratación de nueve componentes del presupuesto, los demás serán ejecutados directamente por la universidad.

## AVANCE FÍSICO

**2.14 %**

	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
ACUMULADO	2.14 %	0.83%	-1.3%
SEMANAL	0.55%	0.06%	-0.97%

Centro Regional Universitario-CRU a corte del 21 de marzo de 2020, con un avance físico programado del **2.14%**.

Fuente: Dirección de Planeación

# EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA VÍAS Y ANDÉNES

Cargue material excavación



Excavación mecánica



Fuente: Dirección de Planeación

## Registro Avance de Obra: I Trimestre de 2020

Trasiego material de excavación



Movimiento de tierra



Fuente: Dirección de Planeación

## AVANCE CONTRATACIÓN

Adjudicación Invitación  
Pública No. 06 de 2020  
(Interventoría)

Adjudicación Invitación  
Privada No. 013 de  
2020 (Agregados  
Pétreos)

Publicación Invitación  
Pública No. 012 de 2020  
(Suministro de Mortero y  
Concreto Premezclado).

Publicación Invitación  
Pública No. 013 de 2020  
(Suministro de acero  
figurado, malla  
electrosoldada, alambre  
negro)

Publicación Invitación  
Pública No. 017 de 2020  
(Suministro de bloque y  
ladrillo)



El equipo de trabajo del CRU teniendo en cuenta la situación actual del país, considera prudente hacer un alto con el avance progresivo programado del proyecto. Lo anterior, basado primordialmente en las disposiciones para mitigar y contener la emergencia provocada por el *COVID-19*. Por consiguiente, en cuanto se retome la normalidad, se prevé un aceleramiento de las actividades gracias a los adelantos en la contratación de mano de obra, interventoría y el suministro de materiales.

# GRACIAS
