



**Uptc**<sup>®</sup>  
Universidad Pedagógica y  
Tecnológica de Colombia  
VIGILADA MINEEDUCACIÓN

## Informe Primer Semestre

**Así  
va la U**

[www.uptc.edu.co](http://www.uptc.edu.co)

**Dr. Jorge Andrés Sarmiento Rojas**  
Director de Planeación

**Ing. Lida Constanza García Gómez**  
Jefe Departamento Supervisión y Control

**LA UNIVERSIDAD  
QUE QUEREMOS**

**Rendición  
de Cuentas**

**2020**

## CONTRATOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2018

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE  
POSGRADOS DE LA UPTC SEDE  
CENTRAL

\$ 22.952.577.546 (Obra e Int)

PLAN DE MANTENIMIENTO  
LOCATIVO DE LA PLANTA FÍSICA  
DE LA UPTC

\$2.250.000.000

## CONTRATOS EN EJECUCIÓN VIGENCIA 2019

CONTRATOS EN EJECUCIÓN (13)  
\$2.102.830.895

CONTRATOS POR EJECUTAR (6)  
\$711.133.899

## CONTRATOS VIGENCIA 2020 SUSCRITOS PRIMER SEMESTRE

CONTRATOS EN EJECUCIÓN (2)  
\$2.262.620.948

CONTRATOS POR EJECUTAR (6)  
\$1.668.183.446

**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**




**AUDITORIO**



**ESTRUCTURA PARA CIERLO RASOS**



**CORREDORES**

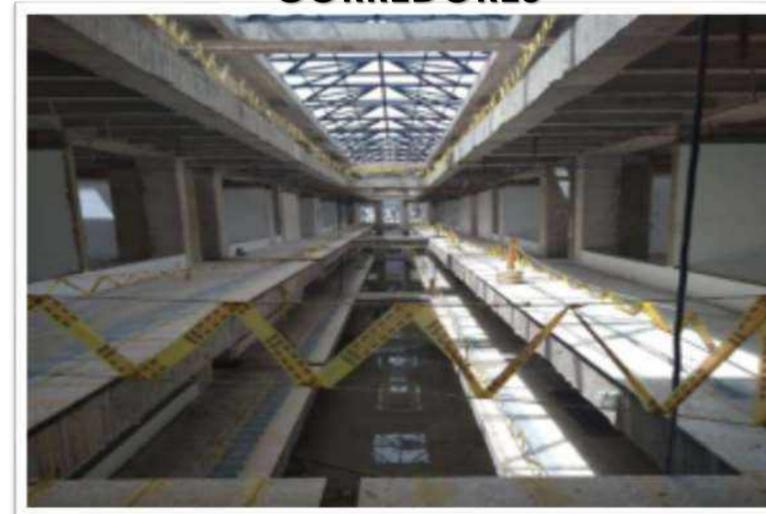

**FACHADAS EDIFICIO**

**ESTRUCTURA  
PARA CUBERTA**



## INVERSIÓN SEGÚN ACTIVIDAD




Total de Ordenes avaladas y priorizadas del contrato: 104

- Total Ordenes Ejecutadas: 96
- Total Ordenes En ejecución: 3
- Tota ordenes Por ejecutar: 5

**EJECUCIÓN DEL 95%**


## ANTIGUA PORTERIA

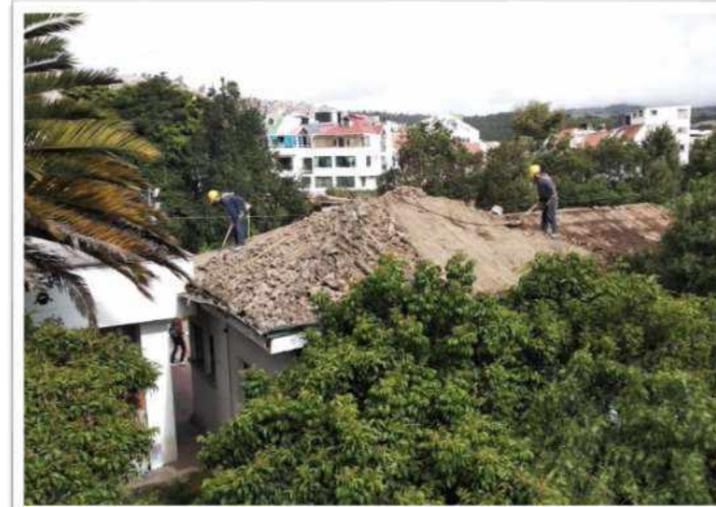

LA UNIVERSIDAD  
 QUE QUEREMOS

“REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS COMPRENDIDOS POR LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y MANUFACTURA SECCIONAL SOGAMOSO”

“REALIZAR ADECUACIÓN DE ILUMINACIÓN PASILLOS DE BLOQUES DE AULAS Y PASILLOS DE BLOQUE DE LABORATORIOS, FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO – UPTC”

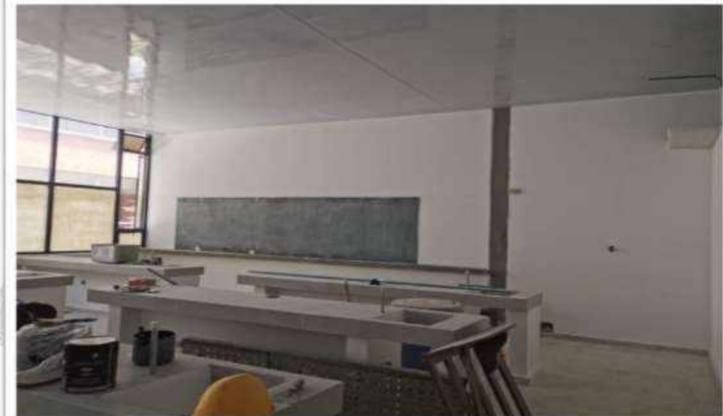

ADECUACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CEAPSI (CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA) EN EL ALA NOR-OCCIDENTAL SEDE SALUD UPTC TUNJA



REALIZAR PRIMEROS AUXILIOS PARA CUBIERTA MUSEO DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD



AMPLIACIÓN COCINA - RESTAURANTE, CONSTRUCCIÓN,  
BODEGAS, AMPLIACIÓN GIMNASIO, CONSULTORIO PYP  
UPTC CHIQUINQUIRÁ



ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE AUDIOVISUALES



REFORMA, ACTUALIZACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN Y  
 REHABILITACIÓN DE LOS ACTUALES ESPACIOS ALEDAÑOS A LA  
 FACHADA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL JORGE PALACIOS  
 PRECIADO



ADECUACIÓN AUDITORIO EDIFICIO DE INGENIERIA Y SALÓN I-201"



# GRACIAS

Rendición  
de Cuentas

LA UNIVERSIDAD  
QUE QUEREMOS

2020
